




COPA 2014 AEROPORTOS

Atualização: 07/06/2011


AEROPORTOS DA COPA

- 13 Aeroportos
- 31 Intervenções
- R\$ 5,79 bilhões

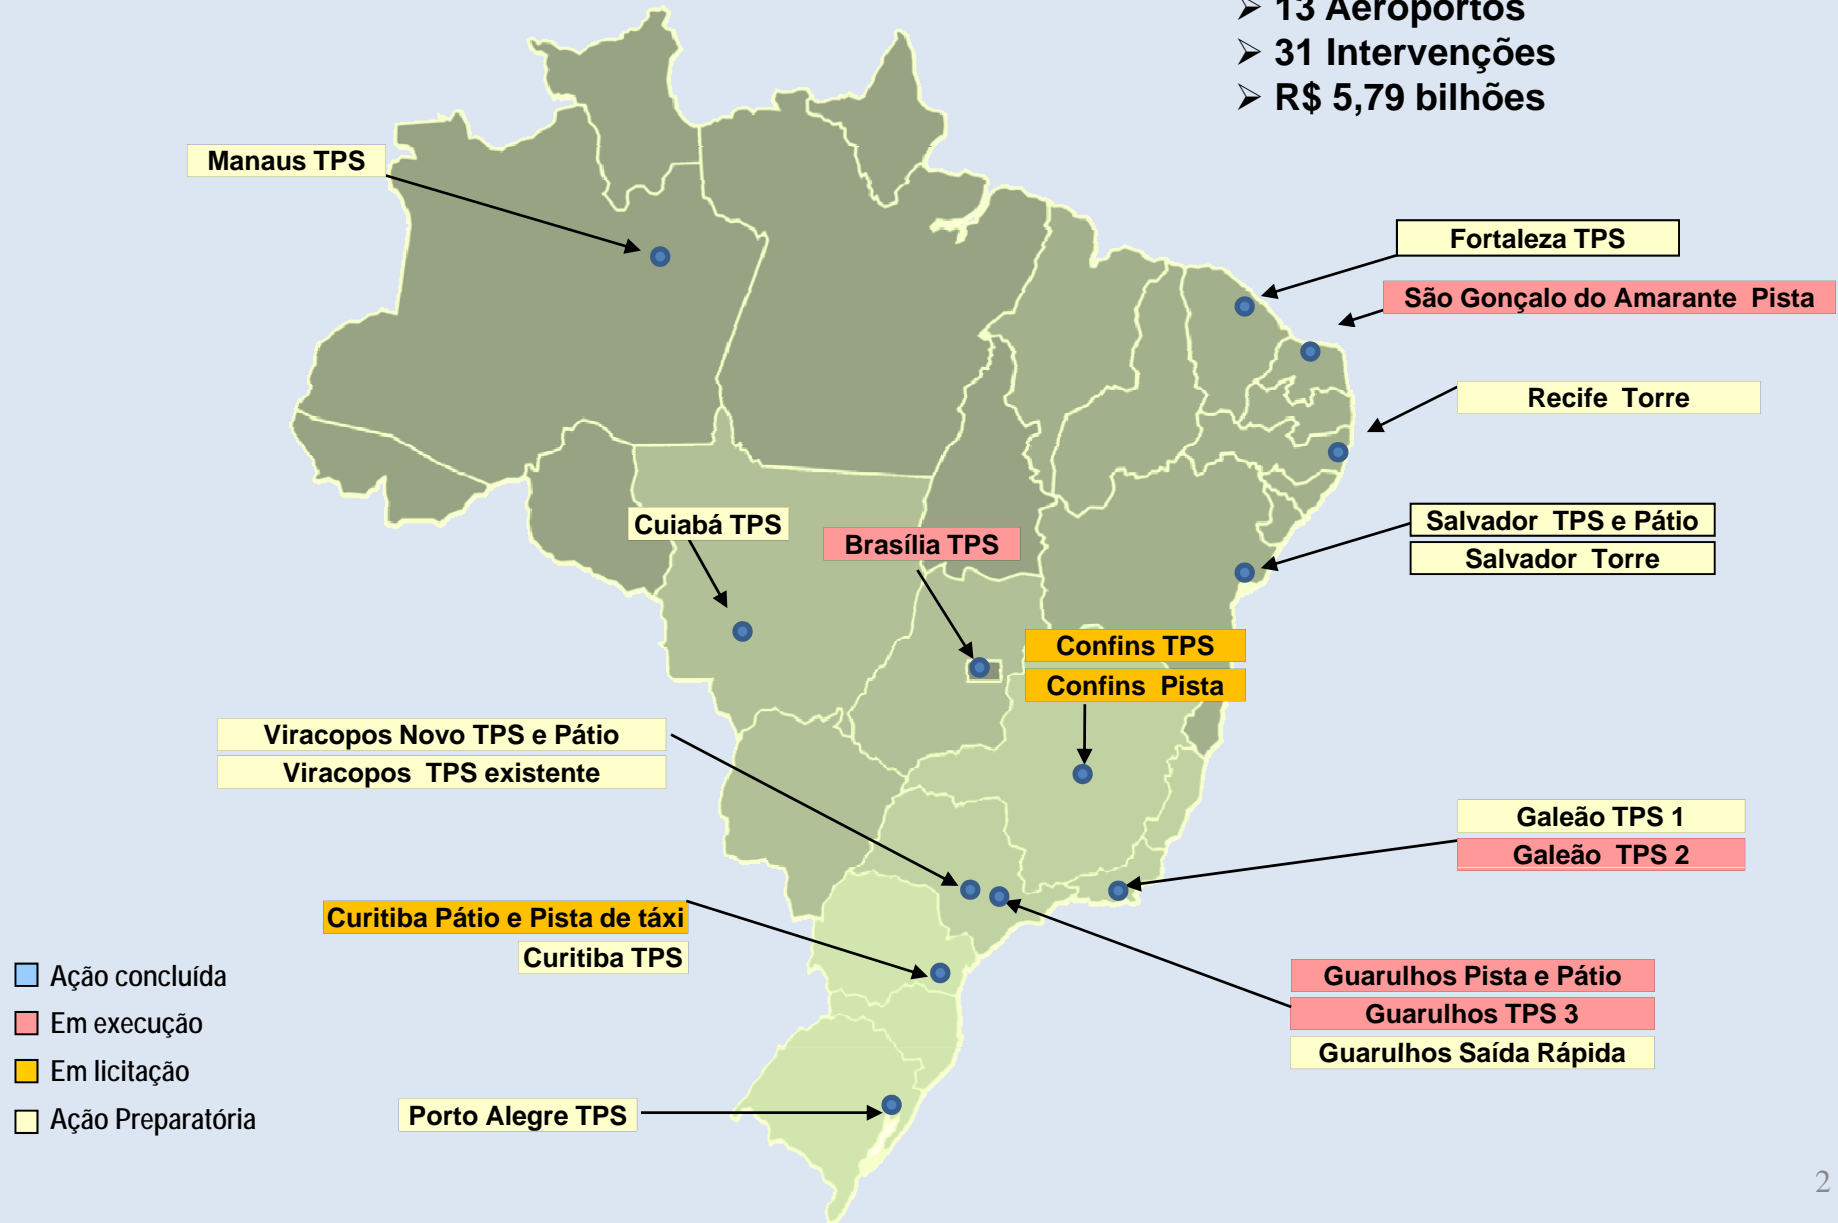


GUARULHOS

GUARULHOS

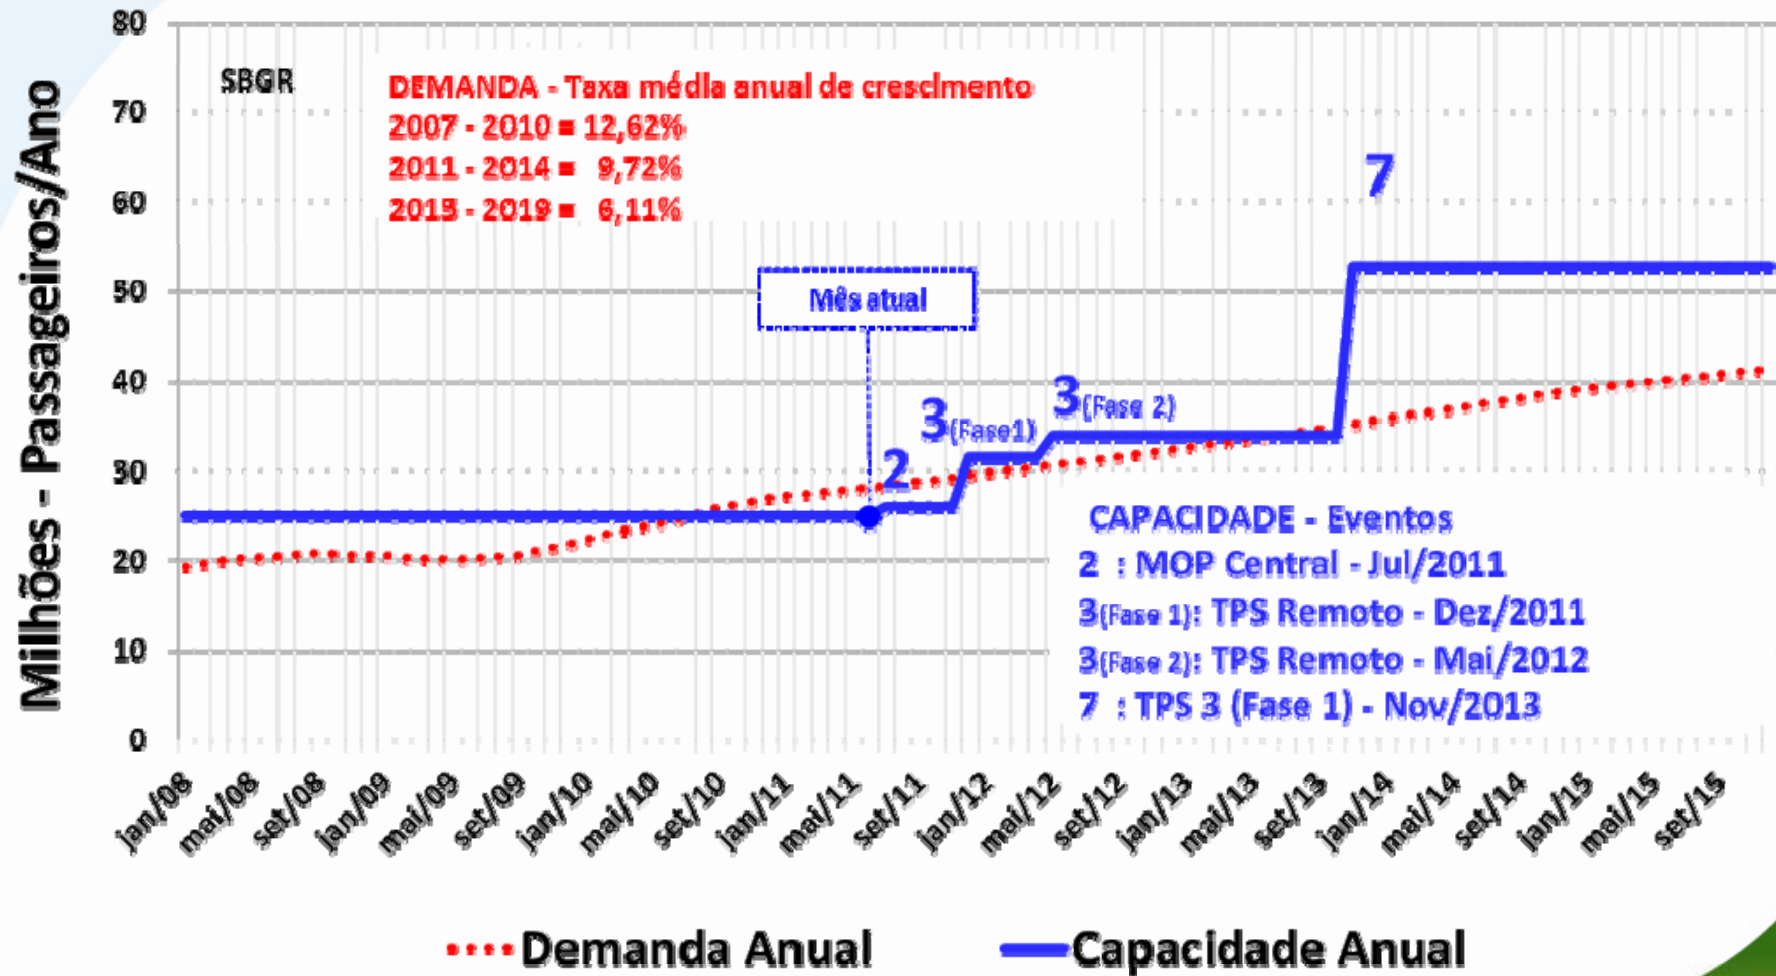

Guarulhos

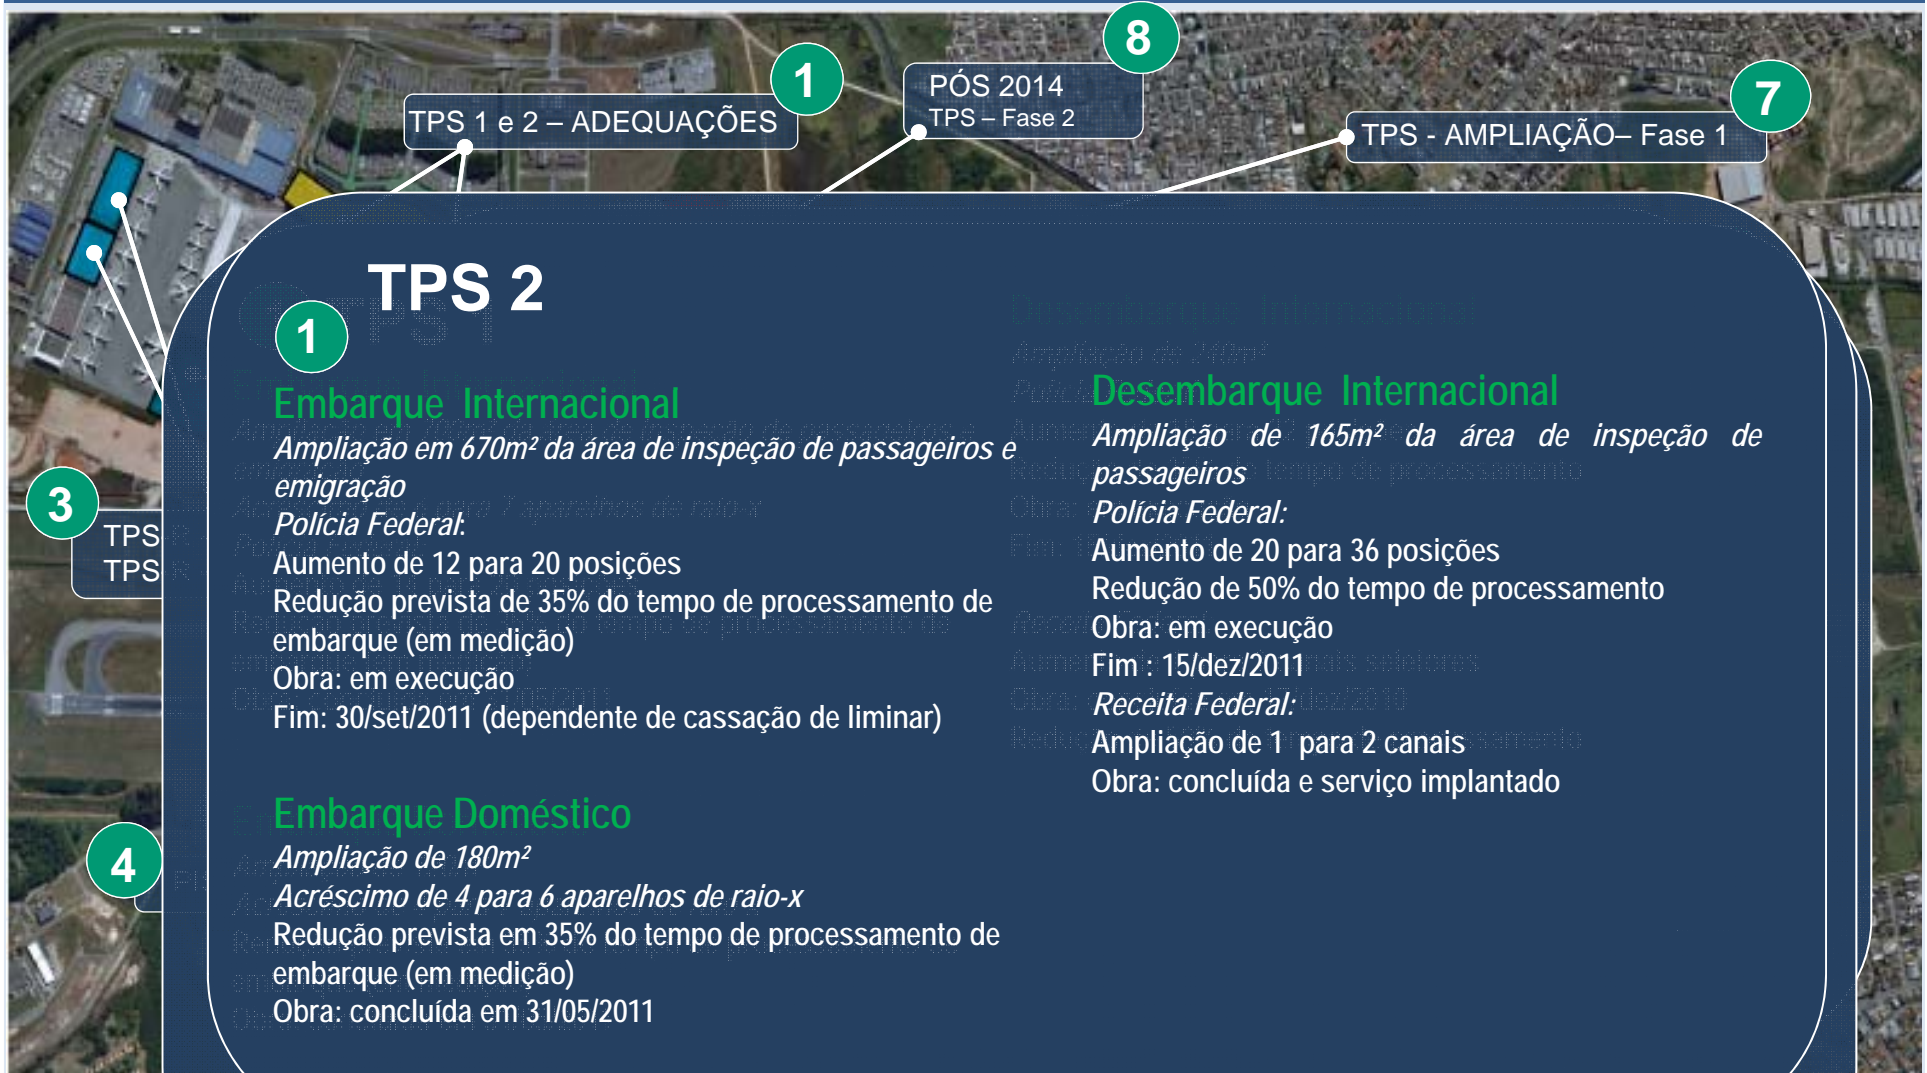

TPS 2

1

Embarque Internacional

Ampliação em 670m² da área de inspeção de passageiros e emigração

Polícia Federal:

Aumento de 12 para 20 posições

Redução prevista de 35% do tempo de processamento de embarque (em medição)

Obra: em execução

Fim: 30/set/2011 (dependente de cassação de liminar)

Embarque Doméstico

Ampliação de 180m²

Acréscimo de 4 para 6 aparelhos de raio-x

Redução prevista em 35% do tempo de processamento de embarque (em medição)

Obra: concluída em 31/05/2011

Ampliação de 240m²

Desembarque Internacional

Ampliação de 165m² da área de inspeção de passageiros

Redução prevista de 50% do tempo de processamento

Obra: Polícia Federal:

Fim: Aumento de 20 para 36 posições

Redução de 50% do tempo de processamento

Obra: em execução

Fim: 15/dez/2011 (data preliminar)

Obra: Receita Federal:


Ampliação de 1 para 2 canais

Obra: concluída e serviço implantado


Valor Total Previsto dos Investimentos: 1,30 bilhão

BRASÍLIA

BRASÍLIA

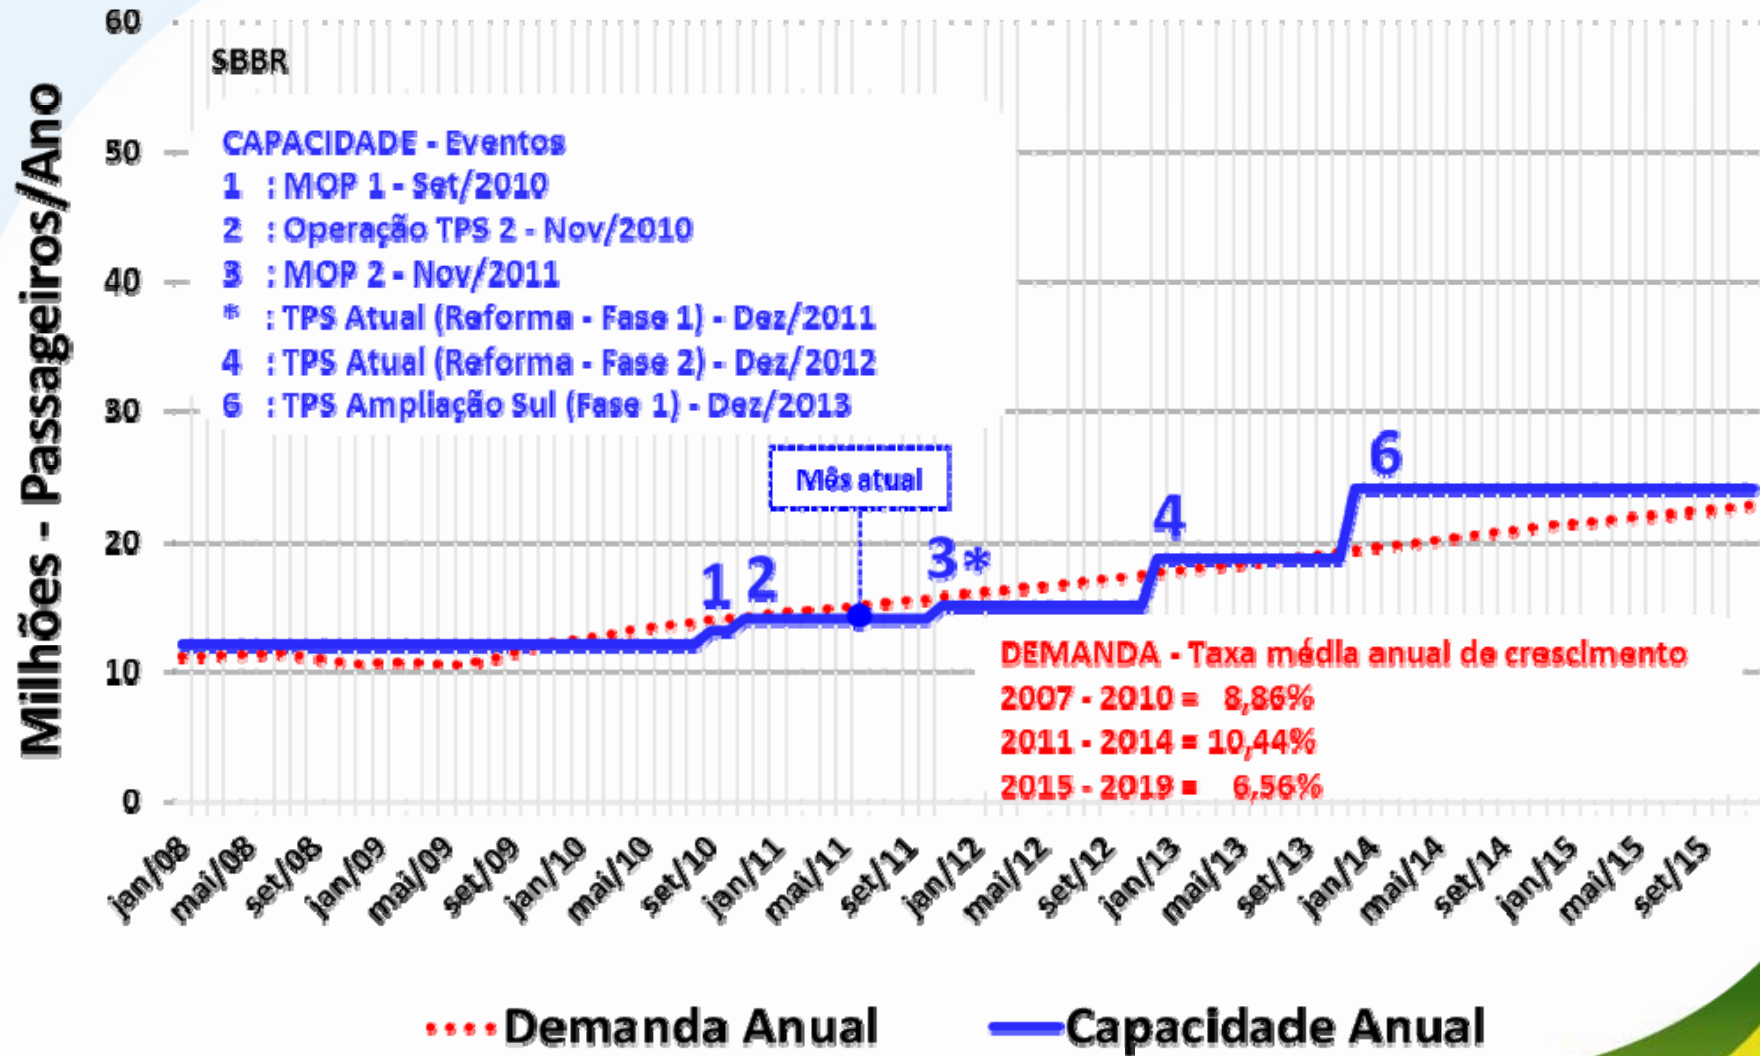


Brasília

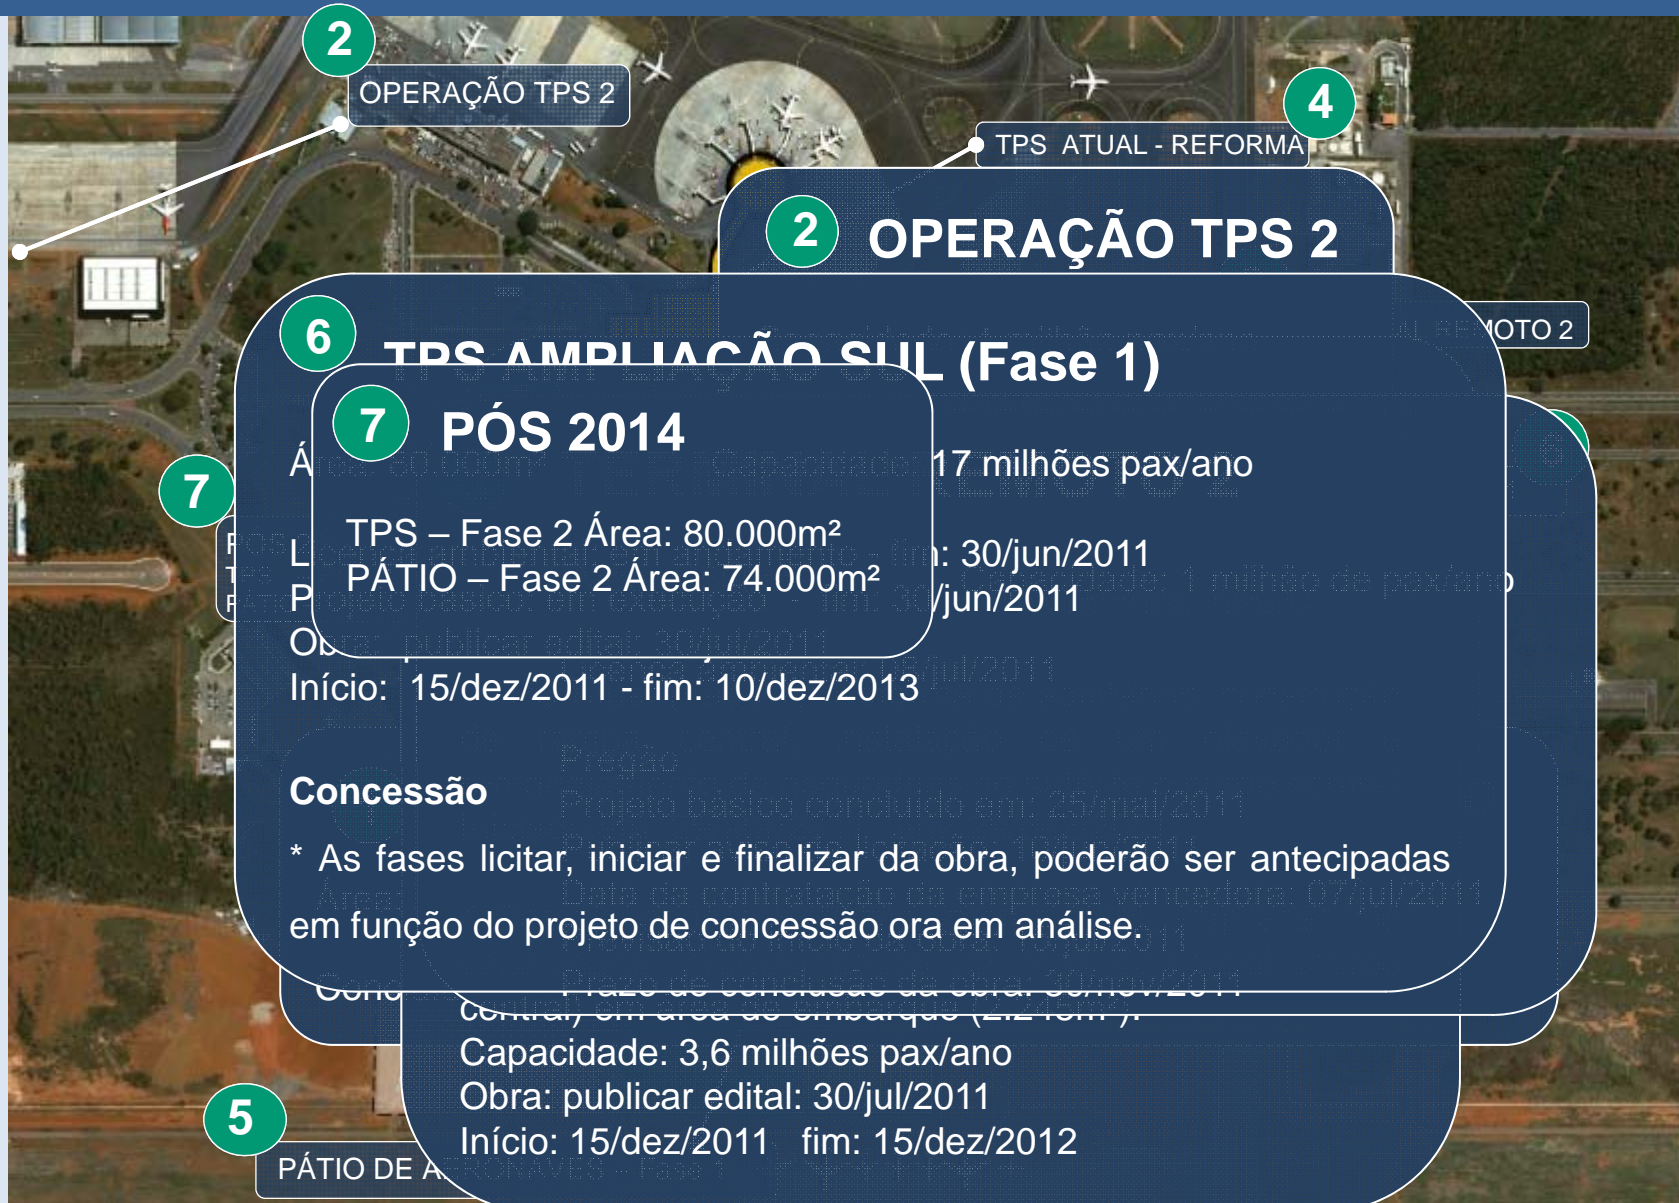

Valor Total Previsto dos Investimentos: 748,40 milhões

CAMPINAS

CAMPINAS

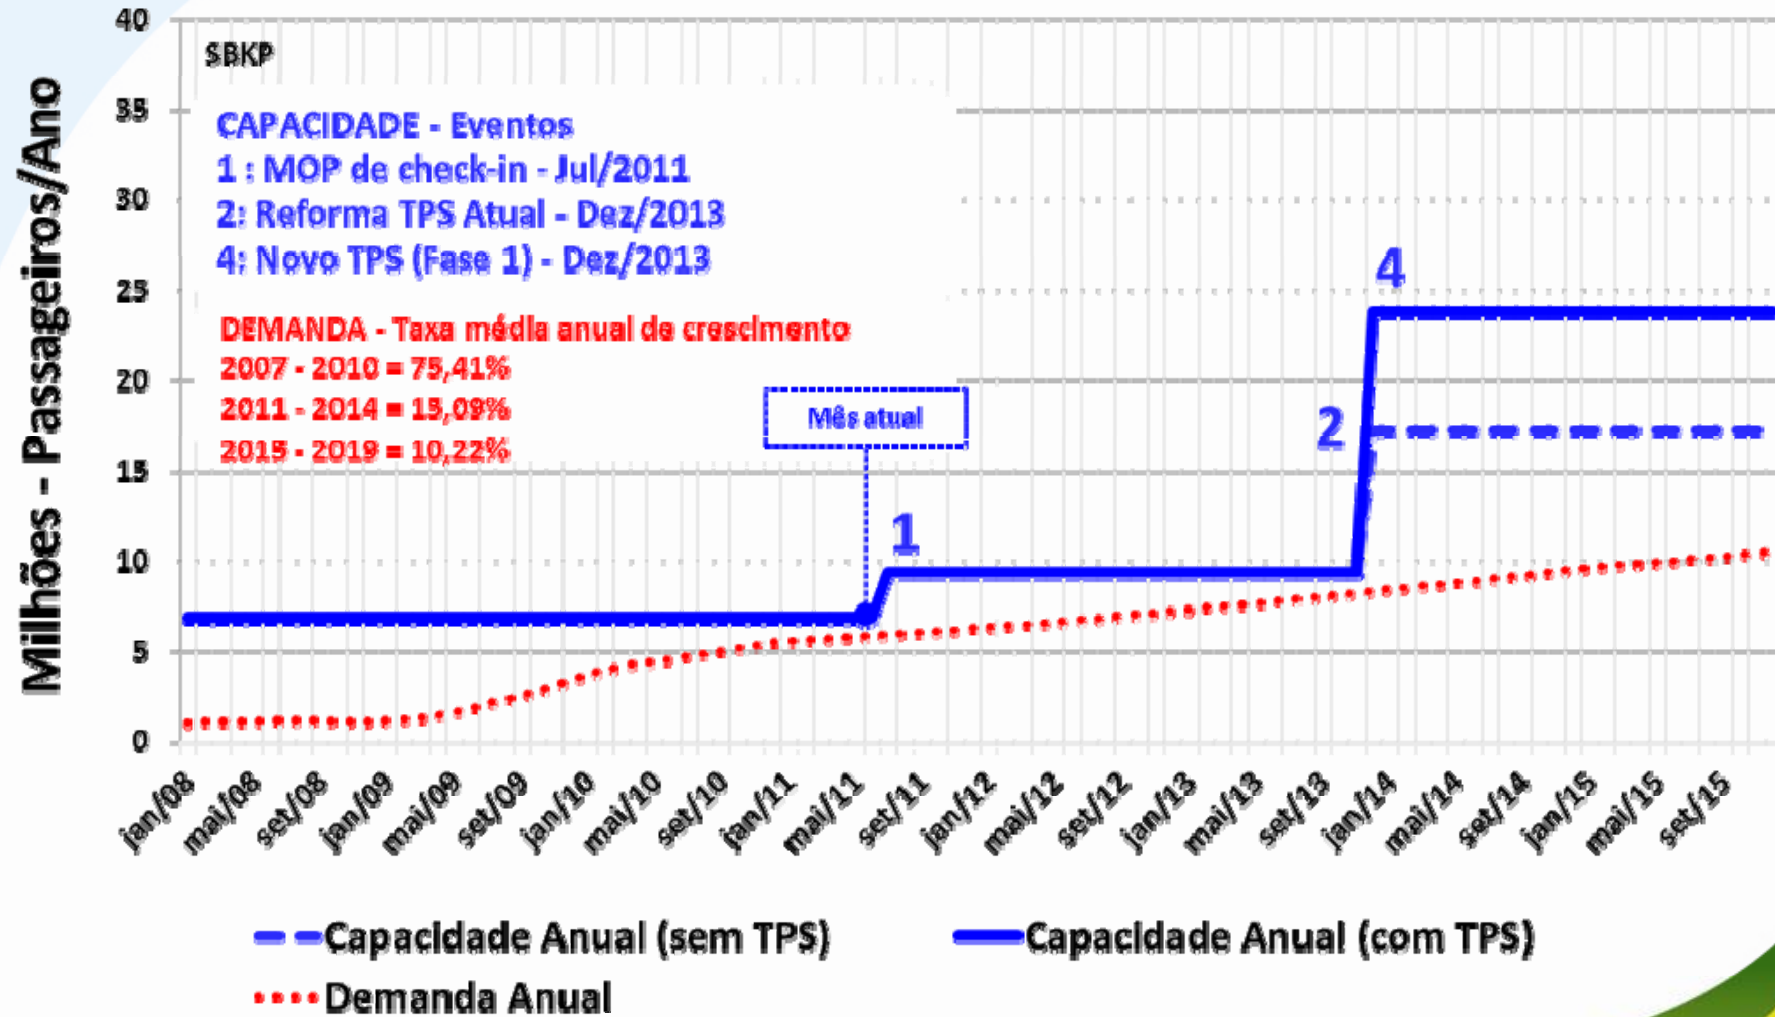

Campinas



Valor Total Previsto dos Investimentos: 796,75 milhões

Campinas

1 Terminal Remoto

Área: 1.719 m² Capacidade: 2,5 milhões de pax/ano

Licença ambiental: concluída

Obra: em execução - fim: 30/jul/2011

TPS -REFORMA

2 Obra de adequação (TPS atual)

Capacidade: 7,9 milhões de pax/ano

Licença ambiental: concluído - fim: 30/dez/2011

Projetos: contratar em 01/jul/2011

Projeto básico: início: 05/jul/2011 - fim: 31/dez/2011


Obra: publicar edital: 15/fev/2012

Início: 01/ago/2012 - Fim: 31/dez/2013

TERMINAL REMOTO

GALEÃO

GALEÃO

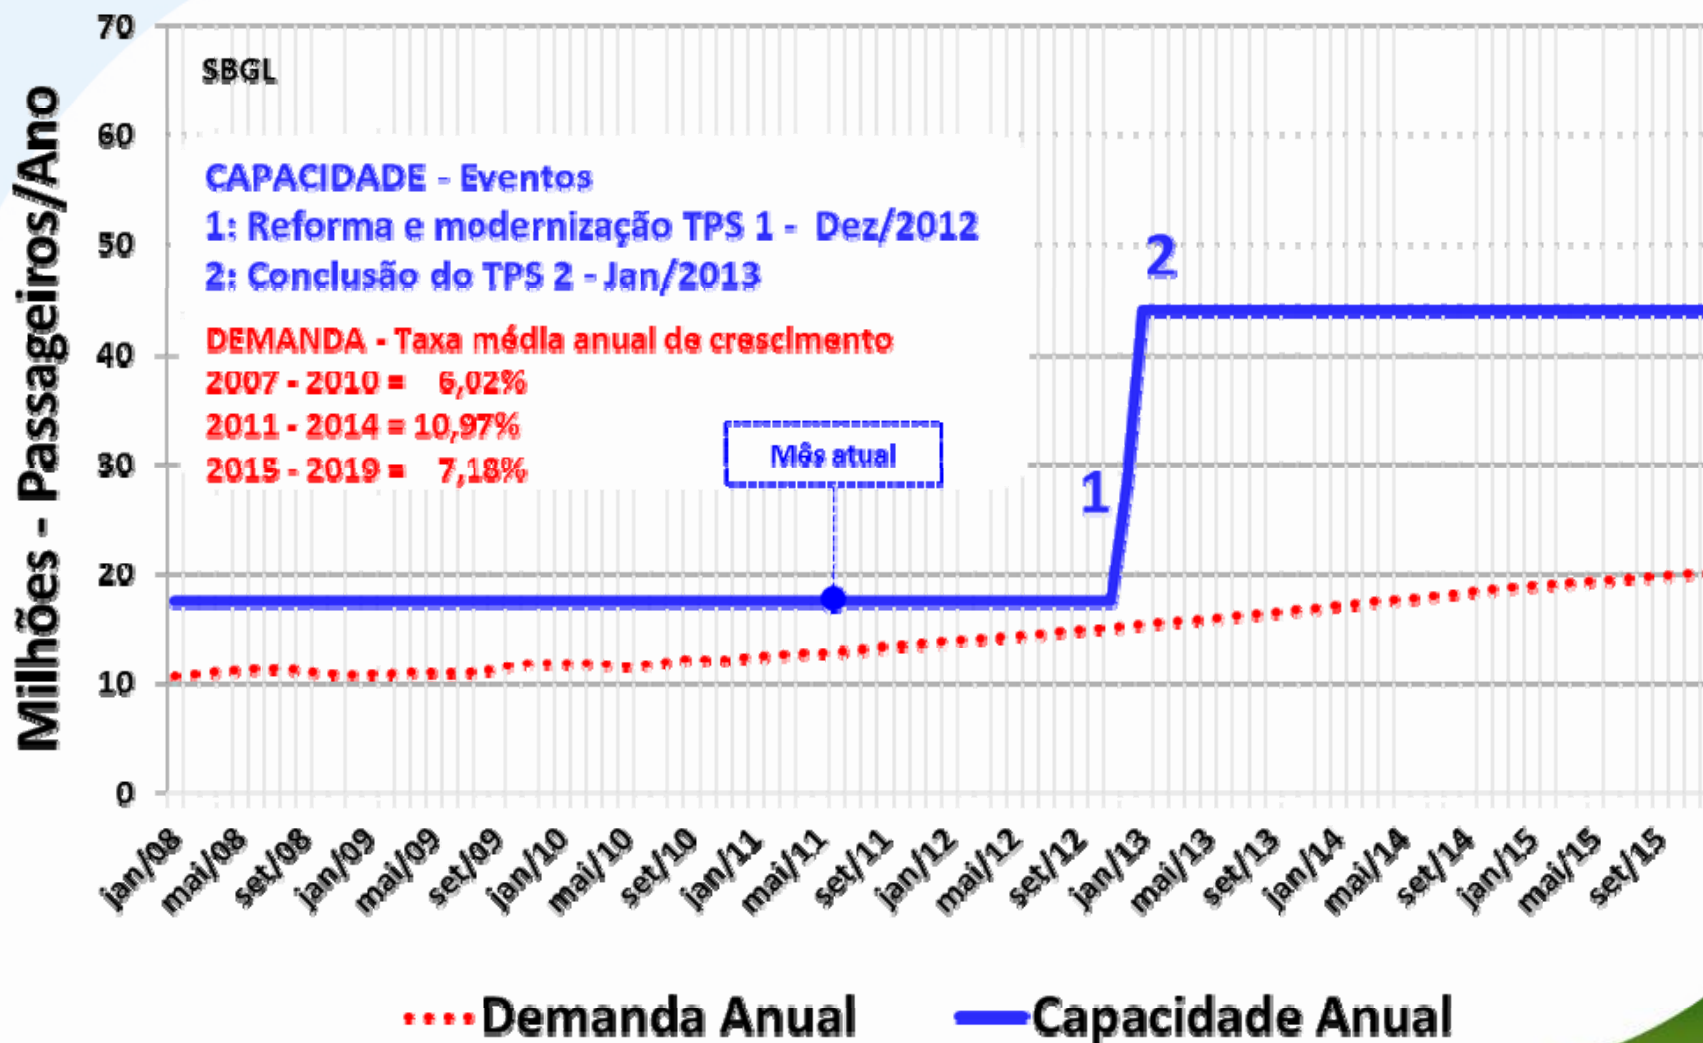

Galeão

1 Revitalização do TPS 1

2 Conclusão TPS 2

Aumento de 46.522m²

Capacidade: 15,9 milhões pax/ano

Licença ambiental: concluída

Projeto básico: concluído

Obra: em execução - fim: 01/jan/2013

Escadas rolantes: 12 novas e 2 substituídas

Pregão: abertura em 01/mar/2011

Contratar até 14/jun/2011

Início: 12/jul/2011 - fim: 01/jul/2013

Projeto básico: concluído


Obra: publicar edital: 22/jun/2011

Início: 15/dez/2011 - fim: 15/dez/2012

Valor Total Previsto dos Investimentos: 657,47 milhões

CONFINS

CONFINES

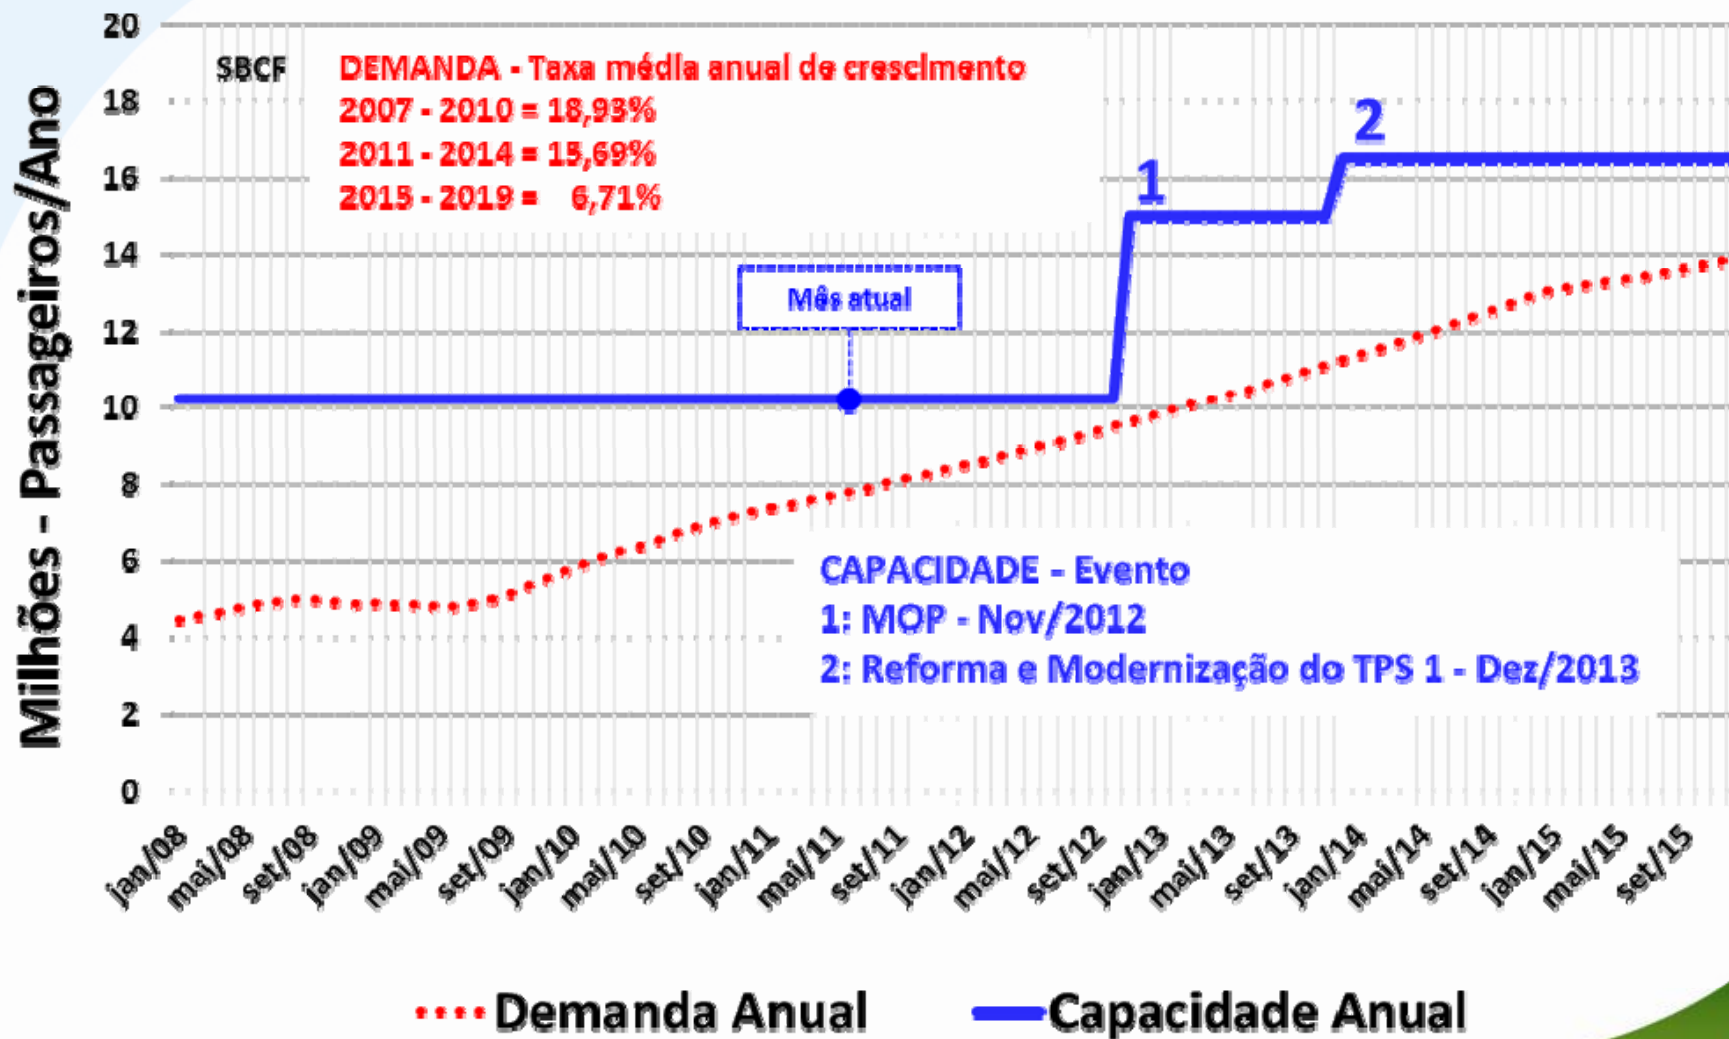


Confinos



Valor Total Previsto dos Investimentos: 406,80 milhões

CURITIBA

CURITIBA

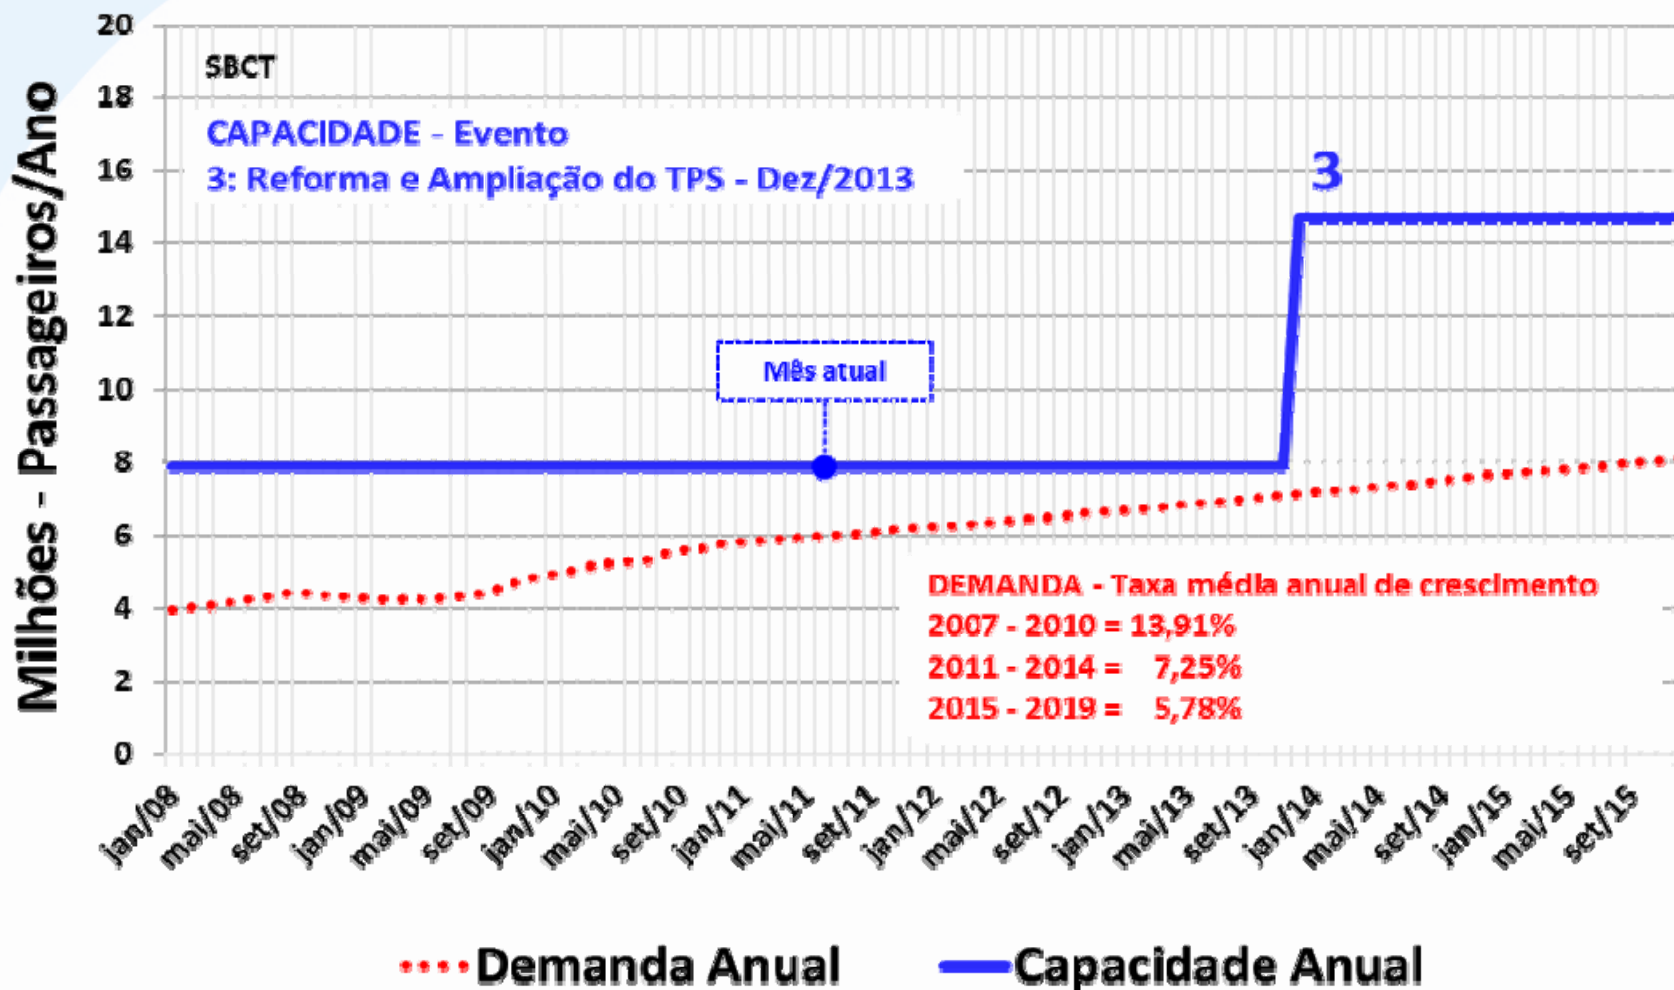

Curitiba



1 Ampliação Pátio

Aumento: 59.879m²

Licença ambiental: concluída

Projetos: concluídos

Obra: publicado edital em 20/jan/2011

Obra: contratada em 25/mai/2011

Início: 15/jun/2011 - fim: 29/fev/2012

4 CAB

Instalação do II

Iniciada em ma

Operação inicia

2

Aumento: 947m

Licença ambiental: concluída

Projetos: concluídos

Obra: publicar edital: 01/ago/2011

Início: 15/jan/2012 - fim: 14/abr/2013

3

TPS
AMPLIAÇÃO


1

PÁTIO DE AERONAVES
AMPLIAÇÃO

Valor Total Previsto dos Investimentos: 101,99 milhões

SALVADOR

SALVADOR

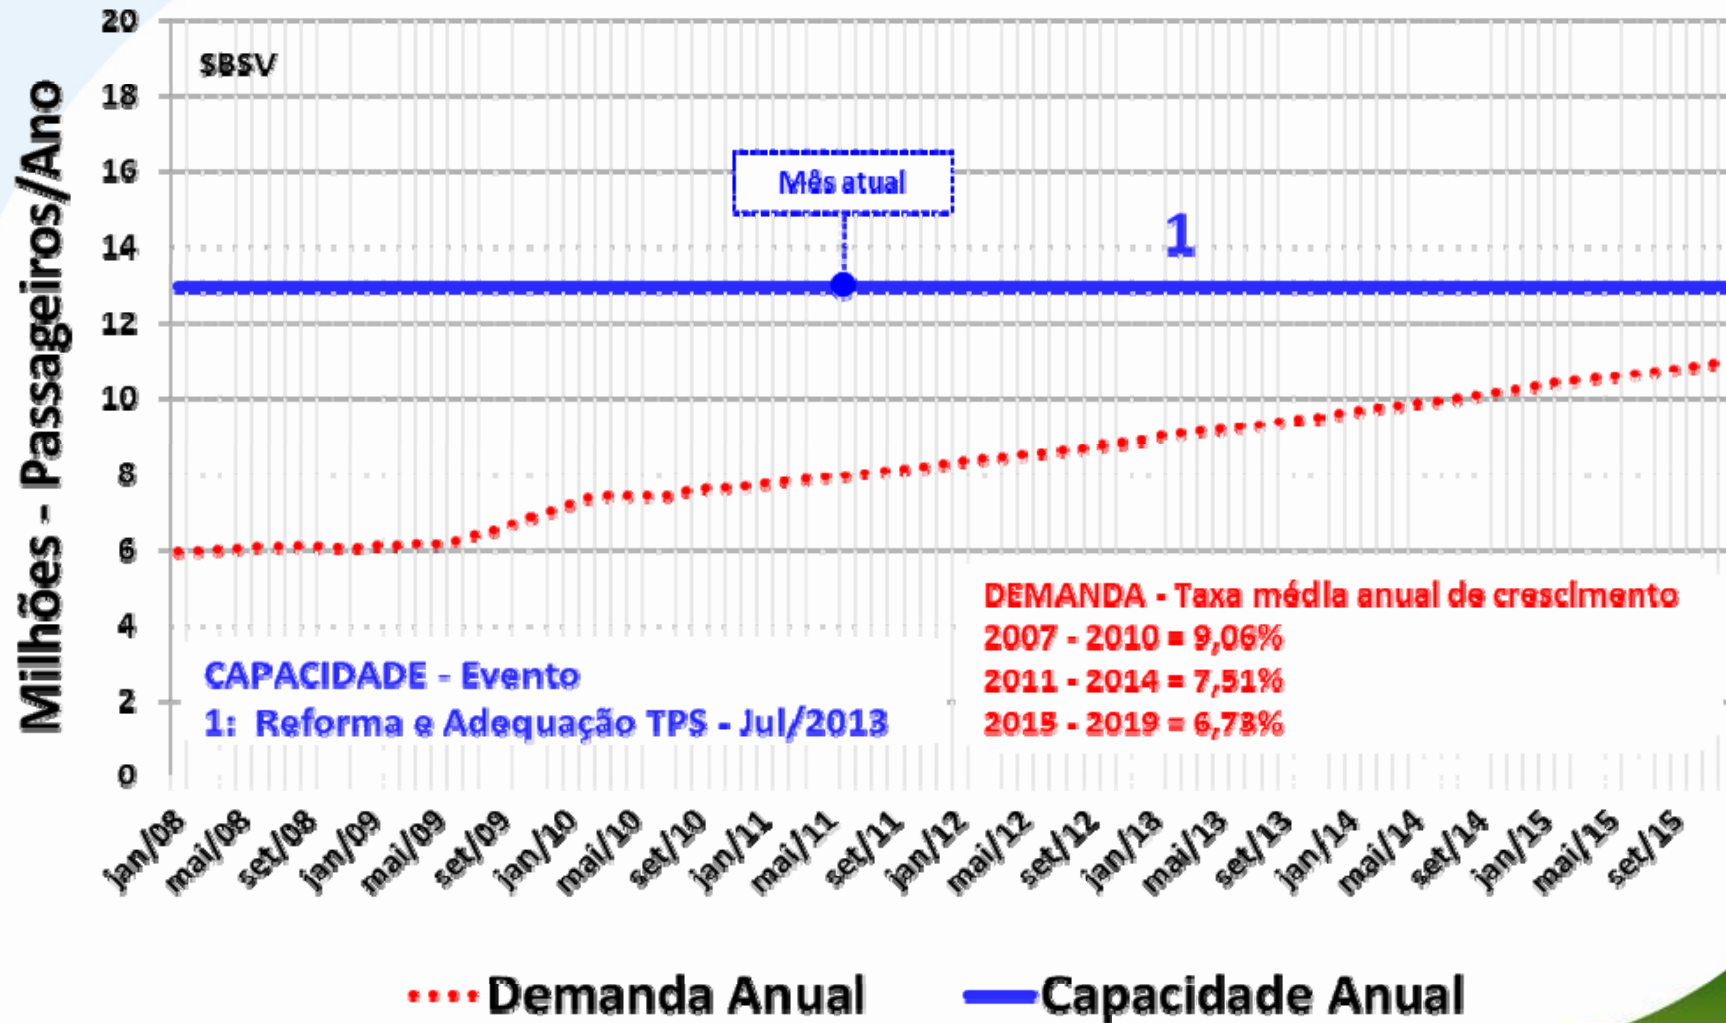

Salvador



Área (torre)

Licença ambiental: em andamento
Projetos: contratados
Obra: início em 19/abr/2011 – fim: 15/out/2011
Instalação: 02/dez/2011

Aumento: 11.750m²

Licença ambiental: em andamento
Projetos: contratados
Projeto básico: iniciado em 19/abr/2011 – fim: 15/out/2011
Obra : publicar edital: 02/dez/2011
Início: 22/mai/2012 - fim: 17/mai/2013


Início: 22/jul/2012 – fim: 17/jul/2013

Obra: 2 meses

Valor Total Previsto dos Investimentos: 47,61 milhões

FORTALEZA

FORTALEZA

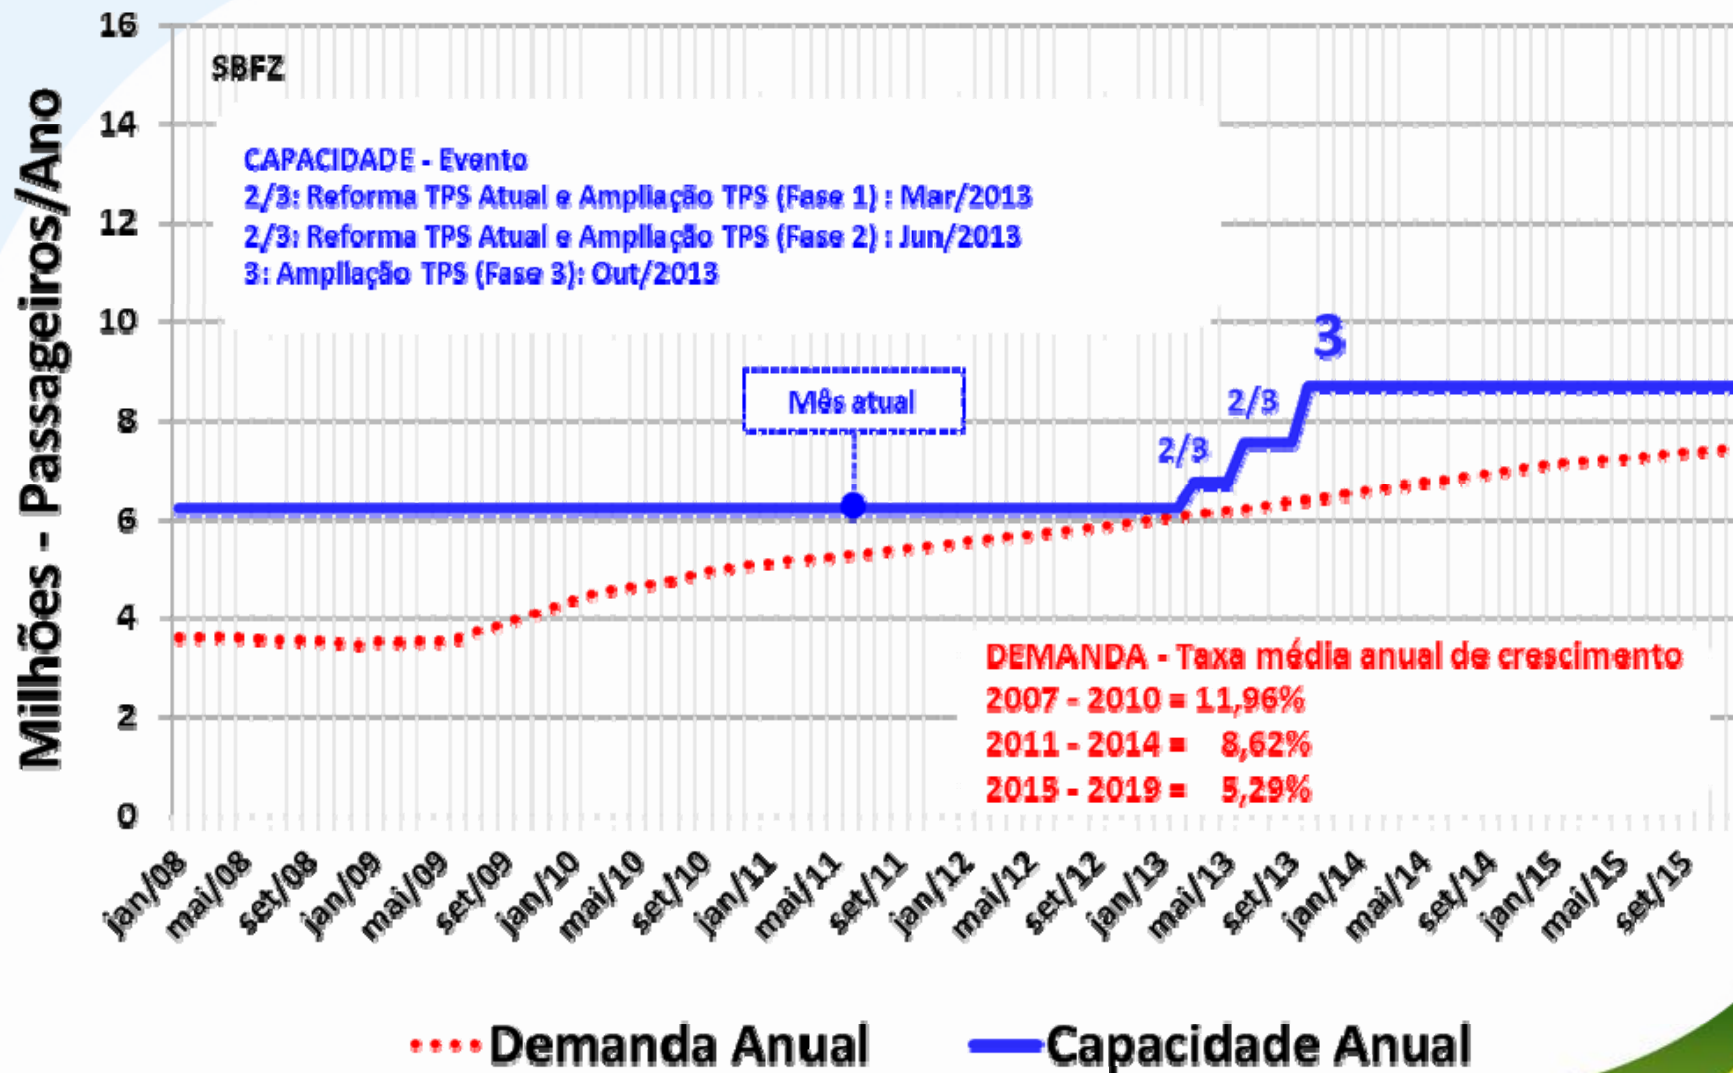

Fortaleza



1 PÁTIO DE AERONAVES – AMPLIAÇÃO

2 **TPS ATUAL – REFORMA (Fase 1)**

Licença ambiental: em andamento
Projeto básico: iniciado em 23/set/2009 - fim: 30/mai/2011
Obra: publicar edital: 15/jun/2011
Início: 13/out/2011 - fim: 13/out/2013

1 PÁTIO DE AERONAVES – AMPLIAÇÃO

Aumento de 30.030m²

3 **TPS – AMPLIAÇÃO (Fase 1)**

Projeto básico: iniciado em 23/set/2009 - fim: 30/mai/2011
Aumento de 27.939m² / Capacidade: 2,4 milhões de pax/ano
Início: 13/out/2011 - fim: 13/out/2013

3 TPS – AMPLIAÇÃO (Fase 2)

Licença ambiental: em andamento
Projeto básico: iniciado em 23/set/2009 - fim: 30/mai/2011
Obra: publicar edital: 15/jun/2011
Início: 13/out/2011 - fim: 13/out/2013


Reforma (Fase 2)
de 30.030m²

Ampliação (Fase 2)
de 33.365m²

Valor Total Previsto dos Investimentos: 349,71 milhões

CUIABÁ

CUIABÁ

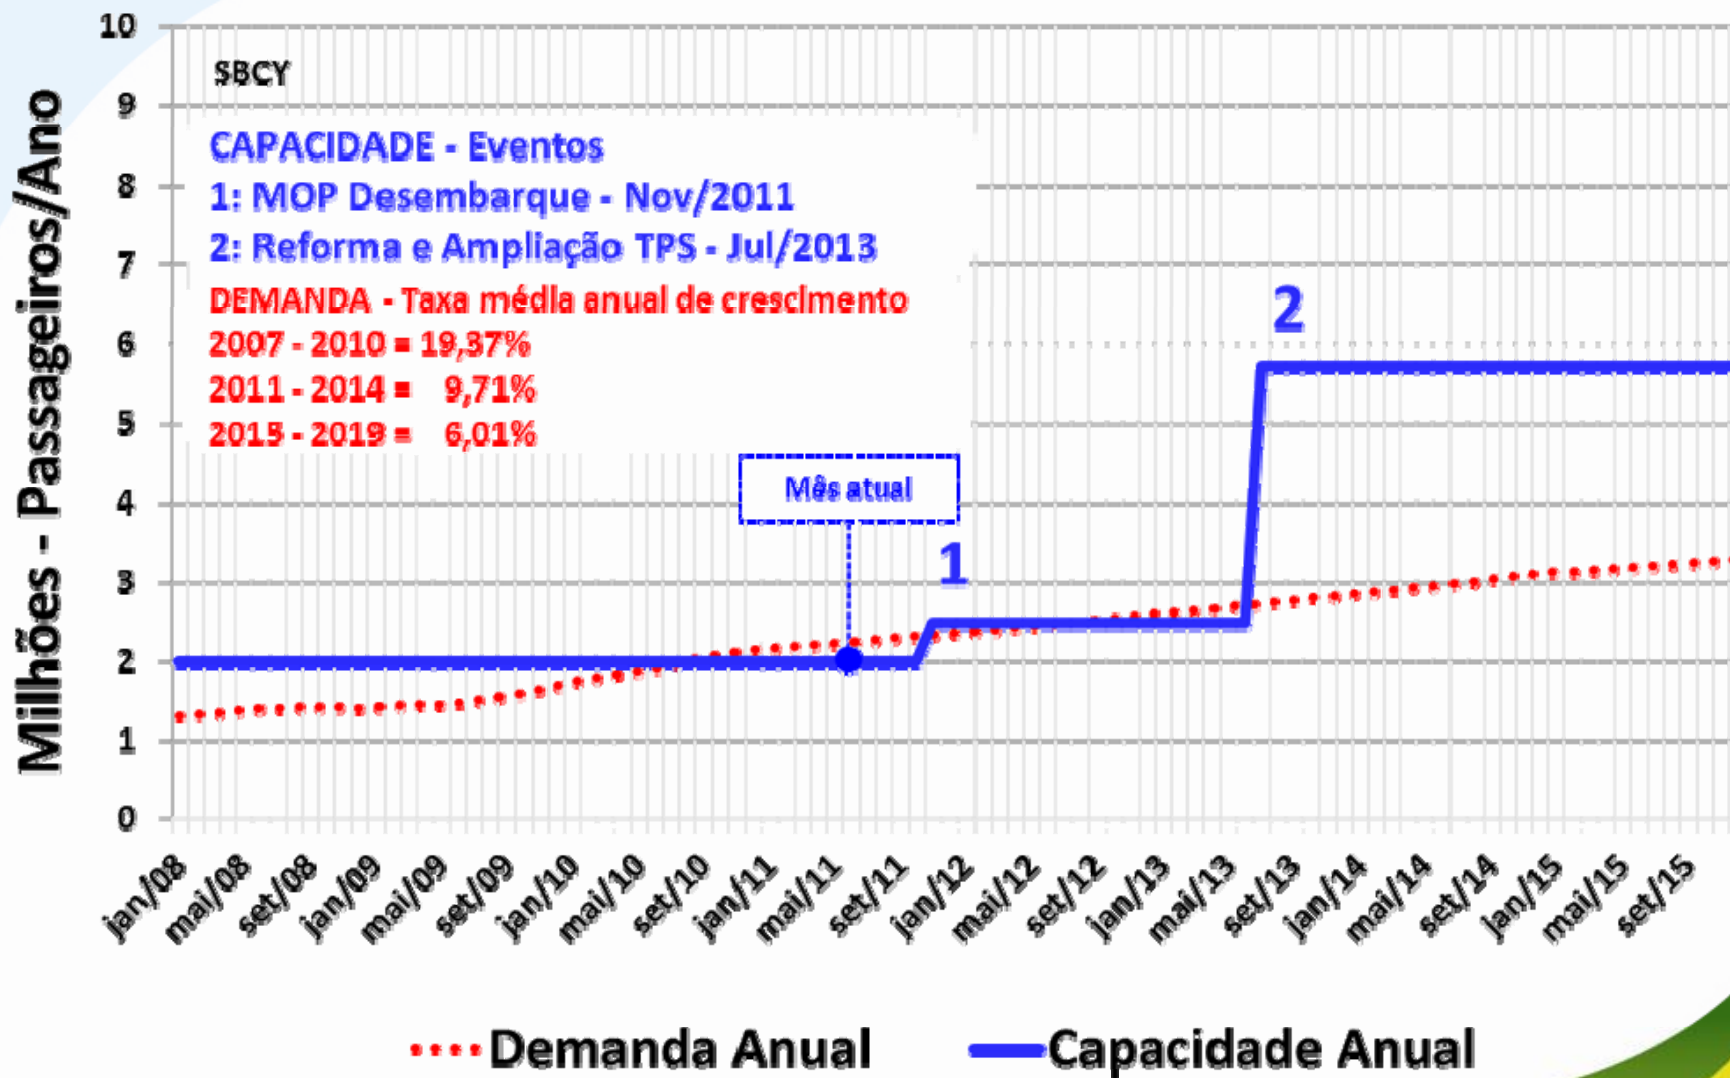

Cuiabá



1
TERMINAL REMOTO

2
TPS – REFORMA E AMPLIAÇÃO

1 **Terminal Remoto – Desembarque**
Área: 375 m² Capacidade: 800.000 pax/ano
Contratado em 30/mai/2011
Jun/2011 - fim: 03/nov/2011


2 **TPS – REFORMA E AMPLIAÇÃO**
Aumento de 7.740m² Capacidade: 4,3 milhões pax/ano
Licença ambiental: concluída
Projeto básico: iniciado em 24/01/2011 - fim: 20/set/2011
Obra: publicar edital: 30/out/2011
Início: 16/mar/2012 – fim: 31/jul/2013

NOVA ADM.
INFRAERO

Valor Total Previsto dos Investimentos: 88,43 milhões

MANAUS

MANAUS

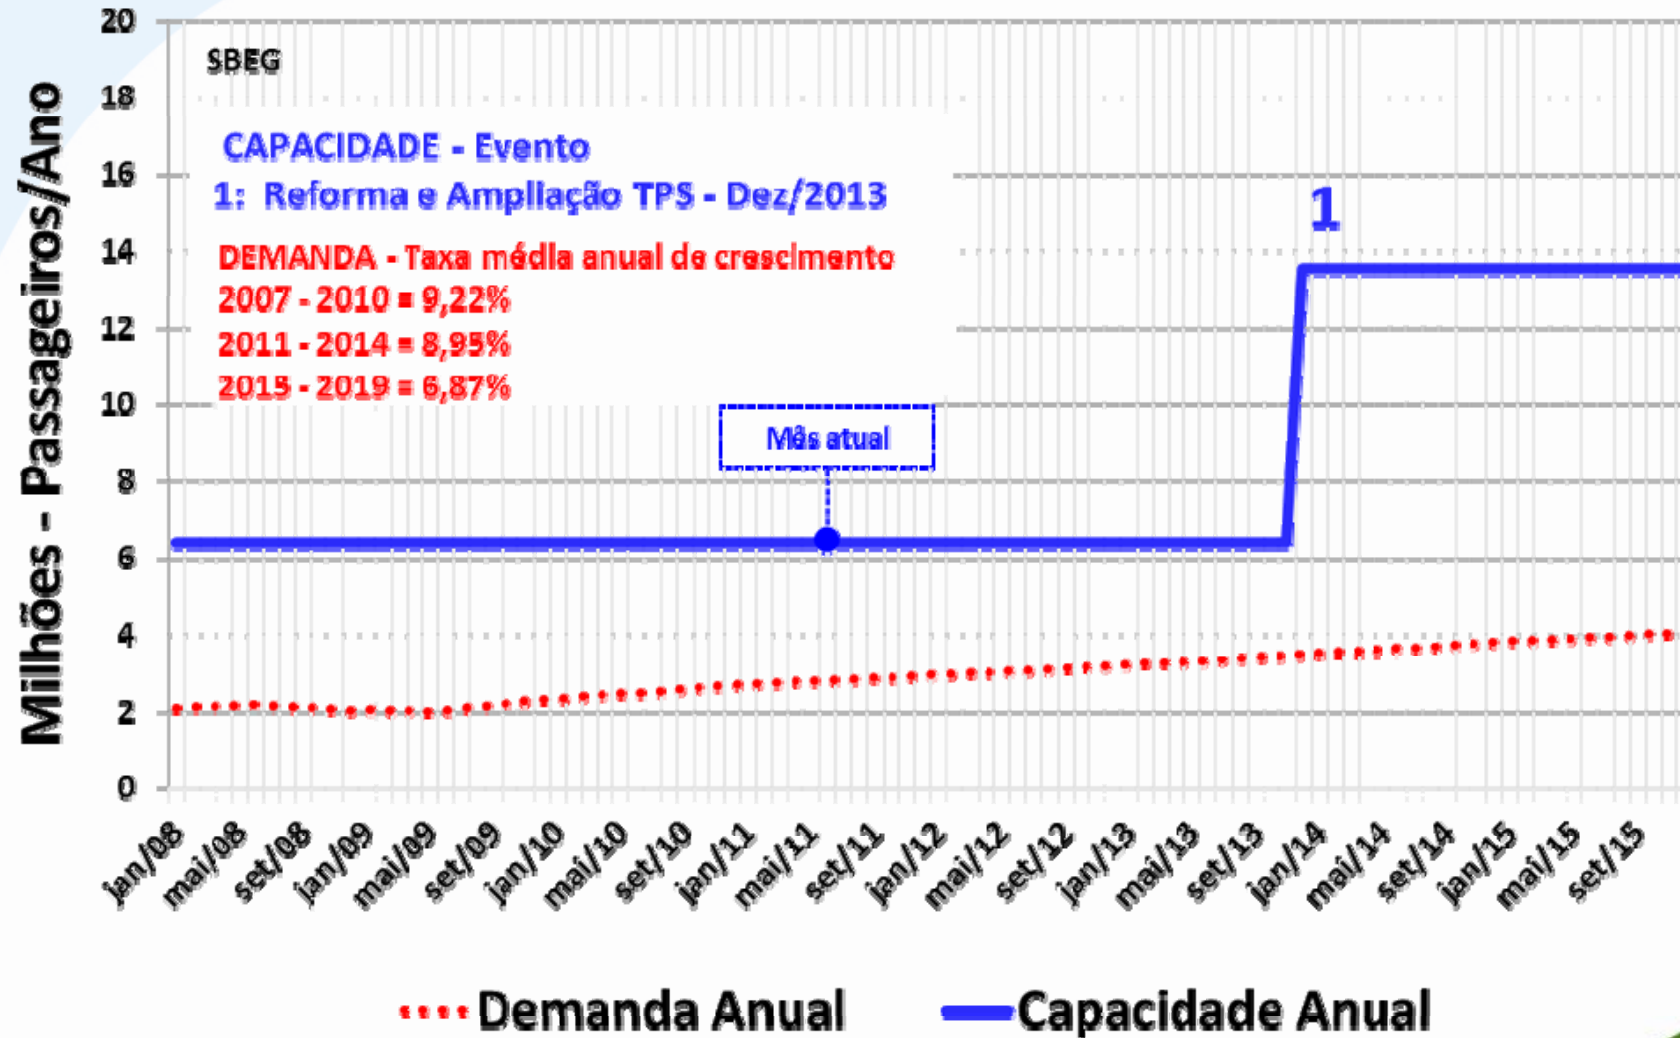


Manaus



Valor Total Previsto dos Investimentos: 415 milhões

PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE

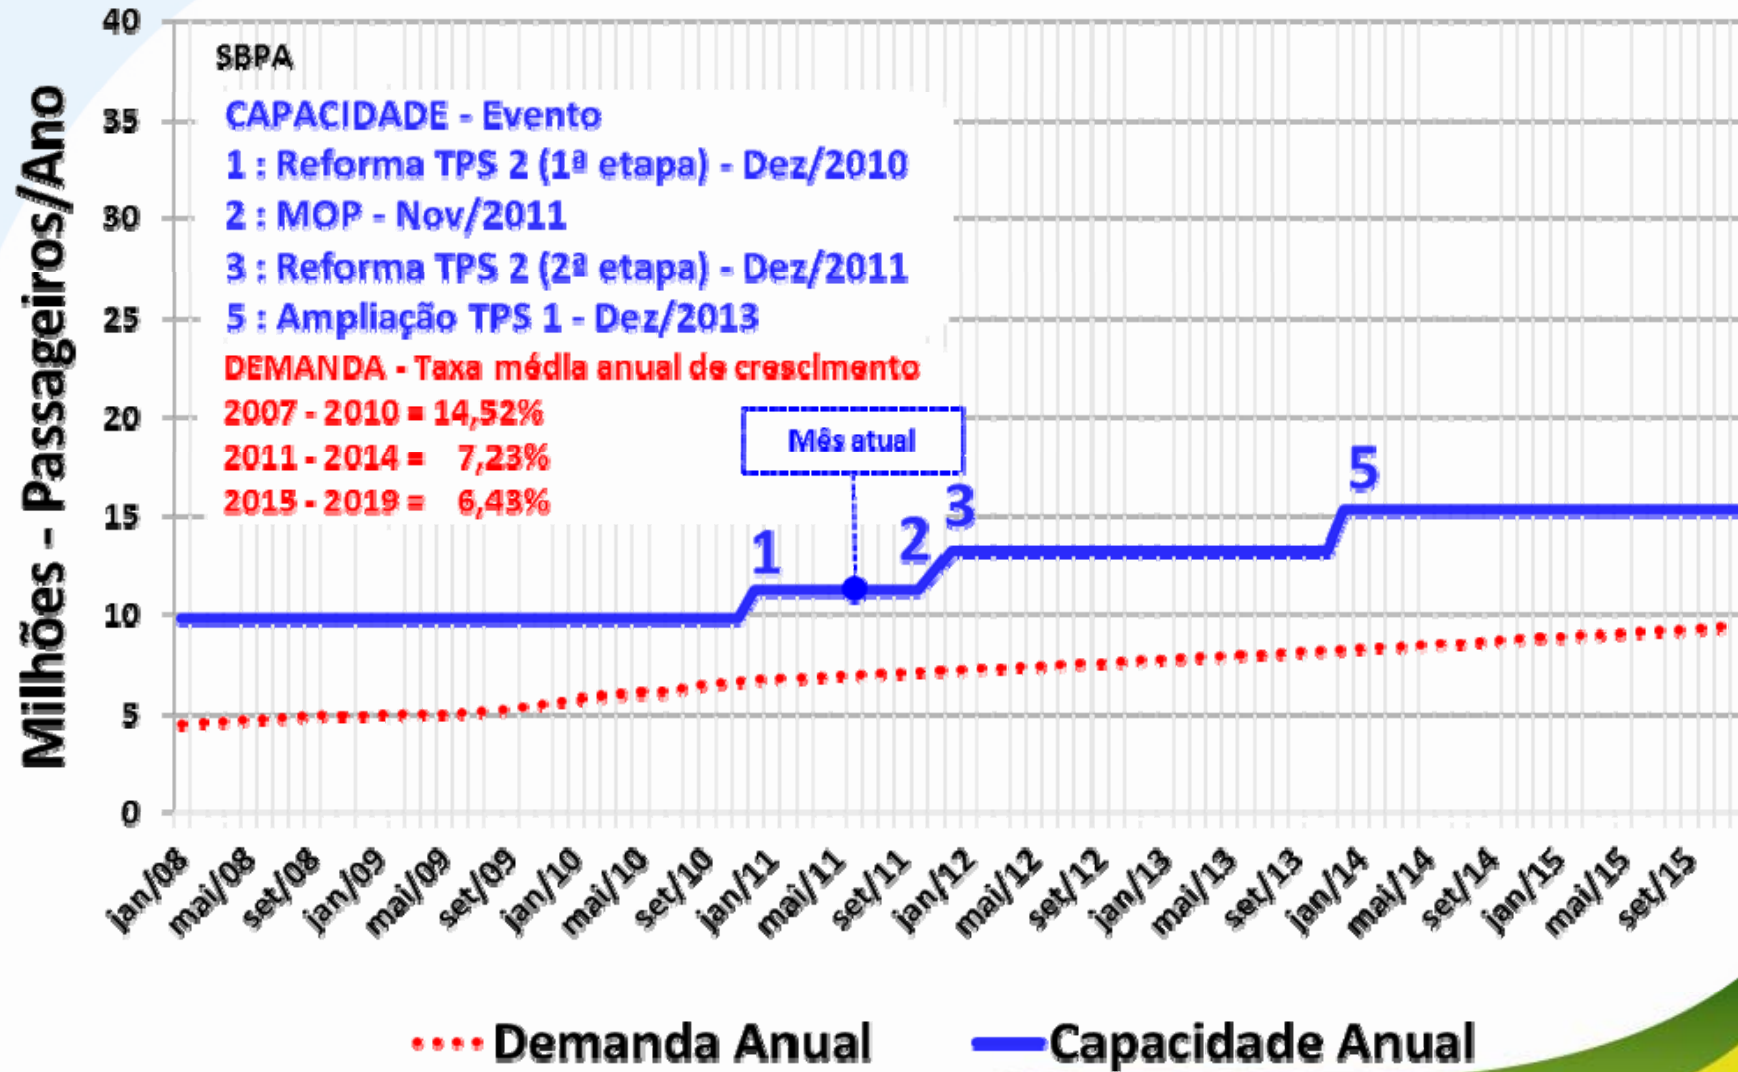


Porto Alegre



Valor Total Previsto dos Investimentos: 569 milhões

RECIFE

RECIFE

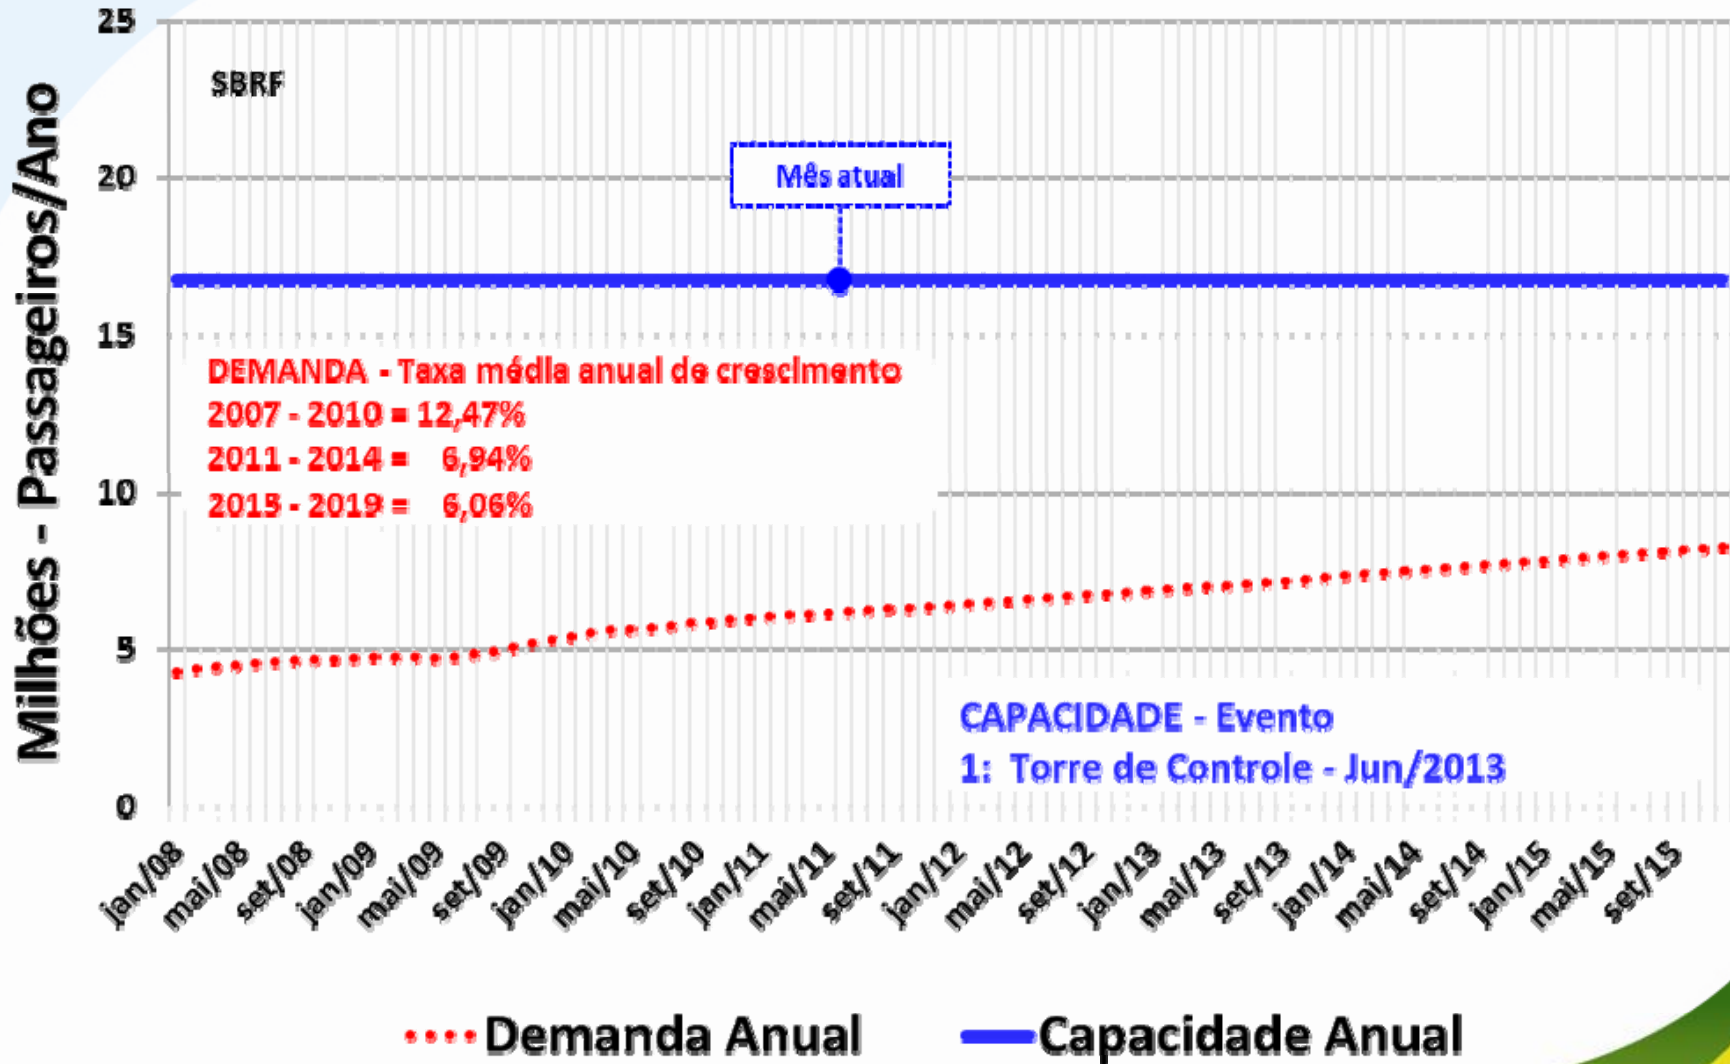

Recife



1

TORRE DE CONTROLE

Área: Torre + pavimento técnico - 308m²

Licença ambiental - Início: 30/jun/2011 – fim: 30/set/2011

Projeto: orçamentação em execução fim: 25/jun/2011

Obra: publicar edital em 01/ago/2011

Início: 02/jan/2012 - fim: 01/jun/2013

Instalação dos equipamentos pelo DECEA: 30/set/2013

1


TORRE DE
CONTROLE

Pista de Pouso/Decolagem

Valor Total Previsto dos Investimentos: 18,47 milhões

AUGUSTO SEVERO

AUGUSTO SEVERO

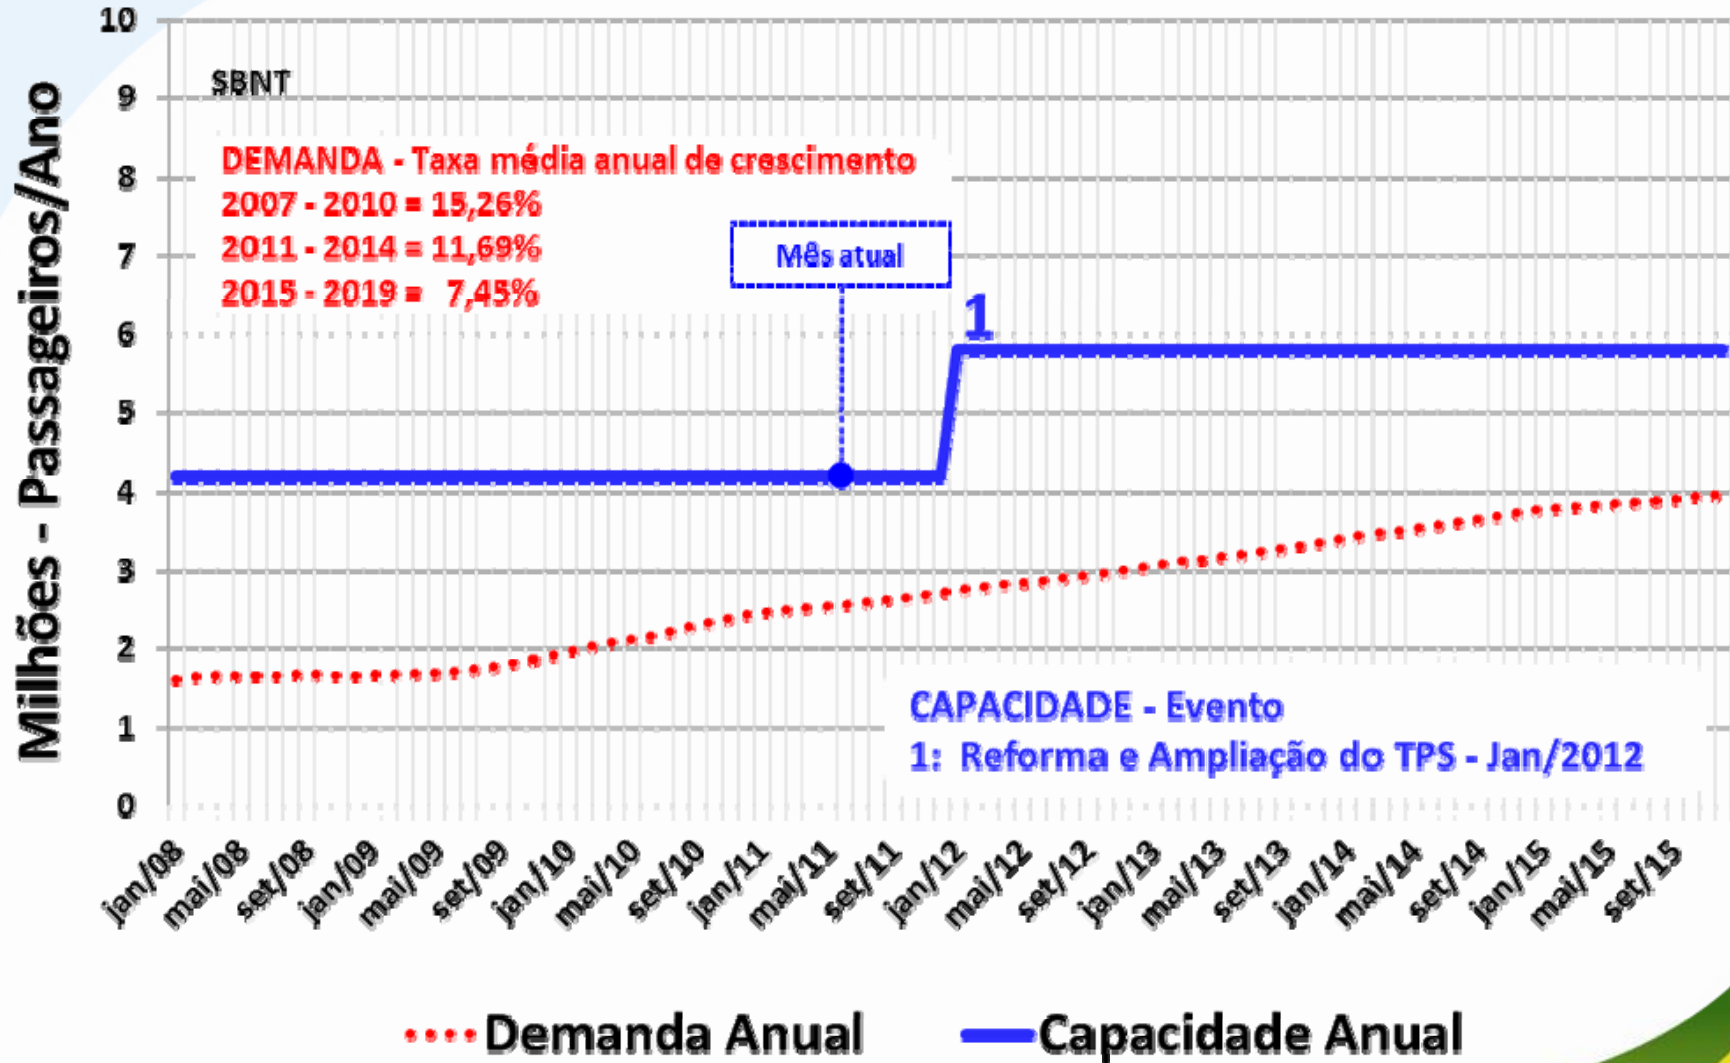

Augusto Severo



Valor Total Previsto dos Investimentos: 16,42 milhões
